


このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

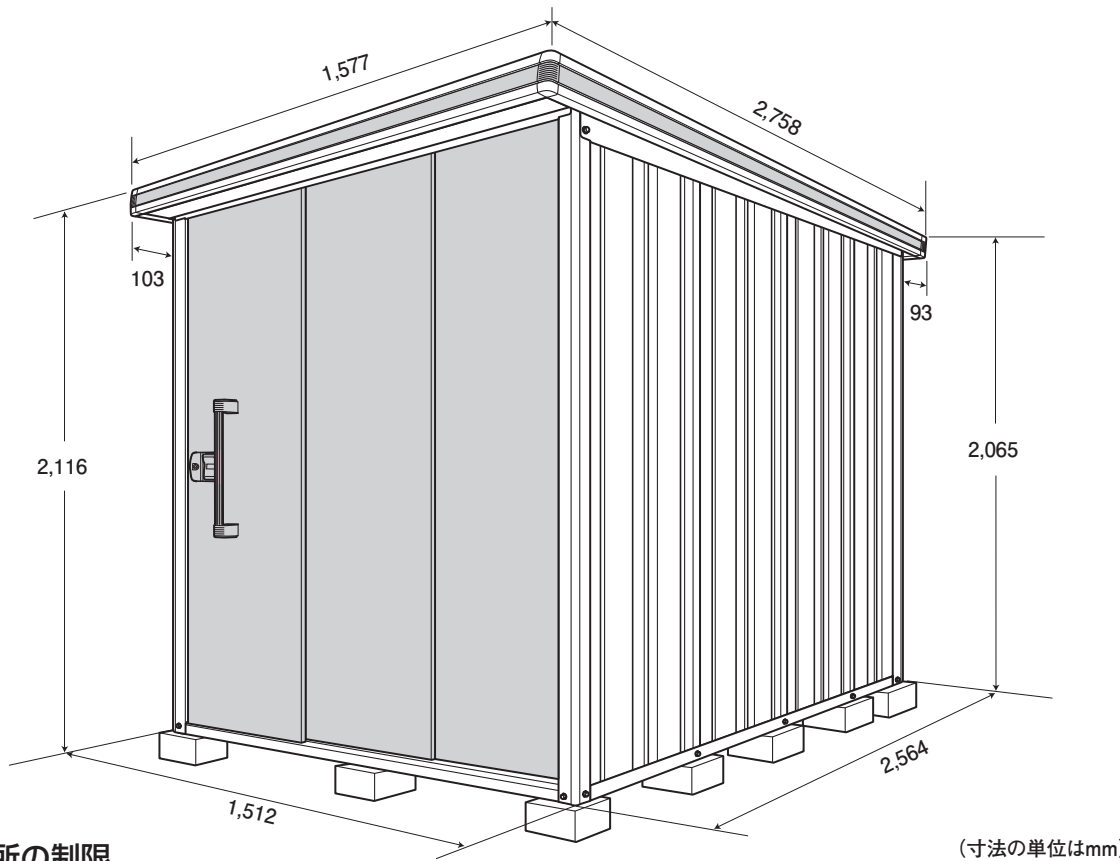

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

△注意

- アンプ工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。●組立の際には手袋を着用してください。
- 梱包・組立部材で重畳物は搬送、据付の際に複数人数で行ってください。
- 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

機 種		1525 型
种	部 品	LM5-0124
	上枠前後	LM5-0203
	下枠前後	LM5-0253
	上枠左右	LM5-0306
	下枠左右	LM5-0356
	柱	LM5-0415
補強	角柱	LM5-1459
	剪断し	LM5-1103
	一般・積雪共通型	LM5-0515
	豪雪型	LM5-3515
	床	LM5-0724
	屋根	LM5-0724
合計	壁根	LM5-0951
	壁	LM5-1004
	床壁	LM5-1004
	袖壁	LM5-1022
	扉	LM5-1053
	欄板	LM5-1703
合計	一般・積雪共通型	LM5-1903
	豪雪型	18
		18

●部品			●柱		
MS-0124			MS-0415		
部材名		数量	部材名		数量
ELD 部材指定定員		2	ELD 前柱 AS-右 L		1
ELD 部材指定定員 M×5×15		5 (1)	ELD 前柱 AS-左 L		1
ELD 柱 補強金具 (AS)		1	ELD 前柱 AS-右 R		2
ELD Tレール補強金具		1	ELD 戸当り (M)		1
Tレールピン		1	ELD 前柱後 L		1
ELD アーチプレート (L)		4	ELD 前柱後 R		1
ELD 座板前側間隔 B		3	●補造 MS-0515		
ELD 座板前側間隔 B		1			
ELD 座板		1			
組立板 M×6×15 (白)		186 (5)			
組立用ボルト		1			
取扱説明書		1	ELDモトモ A-A2.0 DLK		1
保証書 5 年		1	ELDモトモ A-A2.0		1
			ELD 床補強板 A2.0		1

●下枠前後梱包 LM5-0253		●床 LM5-0724	
部材名	数量	部材名	数量
ELD 下枠前 AS-A2.0	1	ELD 床板 A3.5	2
ELD 下枠後 A2.0	1		
ELD 床押入 A2.0	2	●屋根 LM5-0951	

●下枠左右梱包

LM5-0356

部材名	数量
ELD 下枠側 A3.5 (左)	1
ELD 下枠側 A3.5 (右)	1

○部材名称にはA2.0、A3.5等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。
鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

1. まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
2. 部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
3. 部材は、全て鋼製ですので手で切らないようくれぐれもご注意ください。
※安全のため必ず手袋を着用してください。
4. 部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
5. 部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わない場合、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

- ・コンクリートブロック 15ヶ(幅19 cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート (サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)※土の上に設置する場合に必要です。
- ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。


・軍手 ・水準器 ・脚立 ・+ドライバー（右側開口にする場合のみ必要）

	ボルト(白) M6×15		ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15
---	----------------------------	--	---

アンカー工事は設置場所によって下図のような方法があります。強風による転倒防止のため、必ず行ってください。


 注意
 内アンカーにする場合はオプションの「内アンカーセット」が別途必要です。アンカープレート(L)を使って内アンカーの工事はしないでください。

4隅に穴を掘り(下図参照)、施工後にコンクリートを流し込んでアンカープレート(L)を固定します。

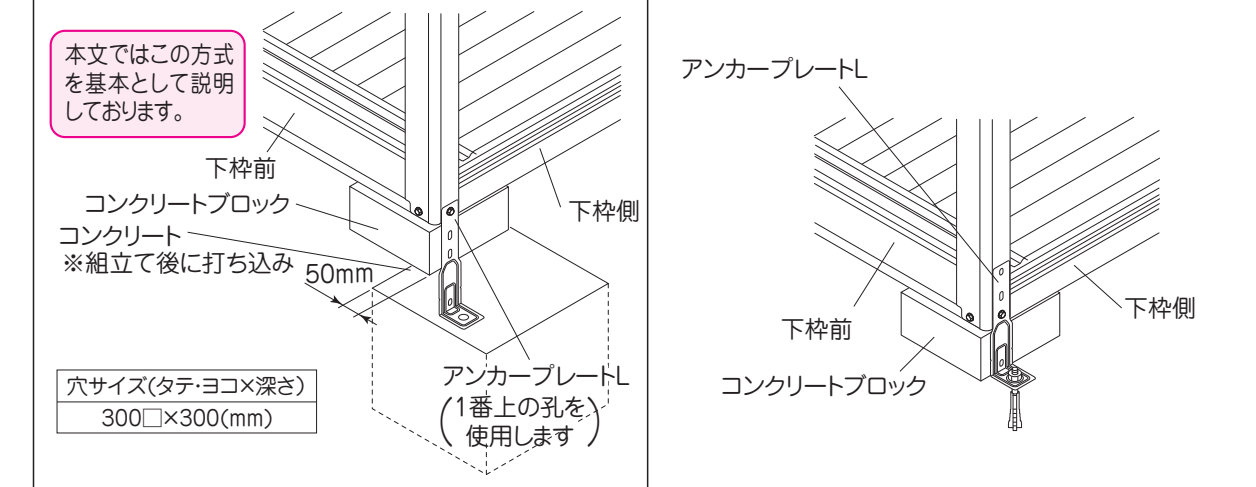


△注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情（基準風速・凍上による不陸など）にあわせて設計・施工してください。


②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)

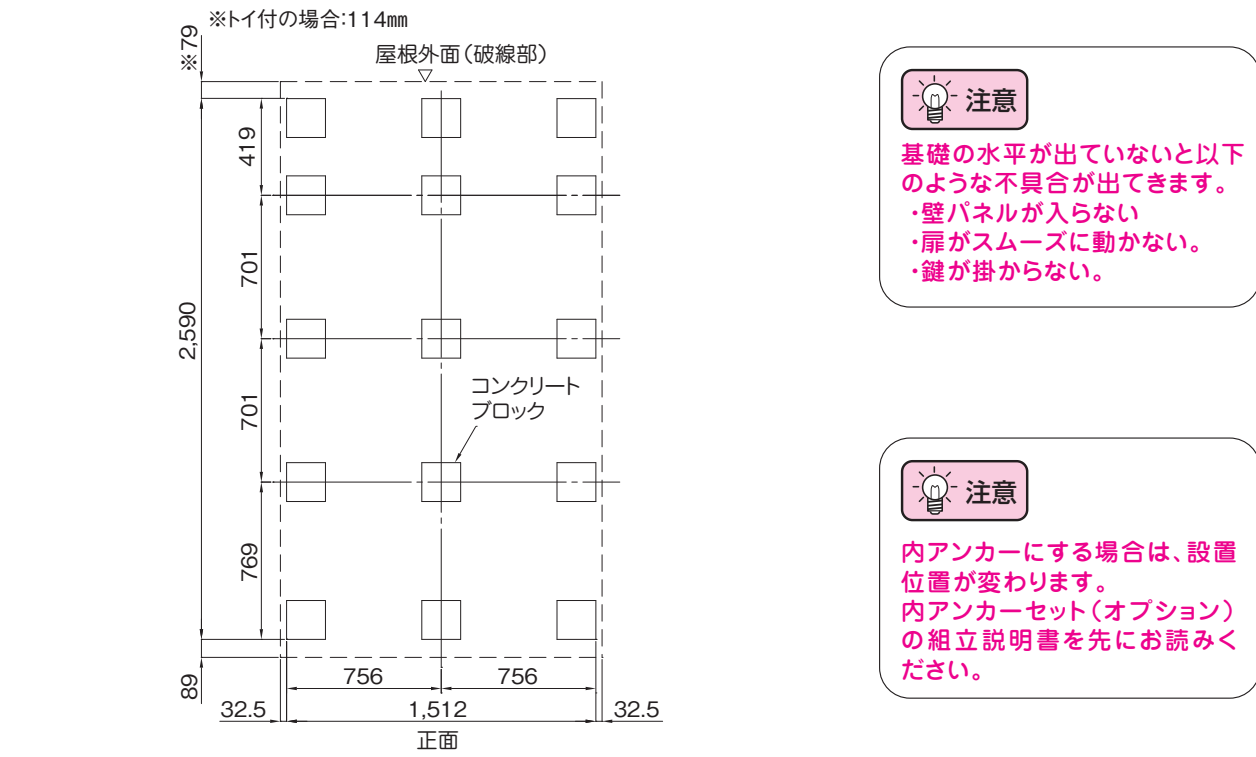


《布基礎の場合》（詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。）

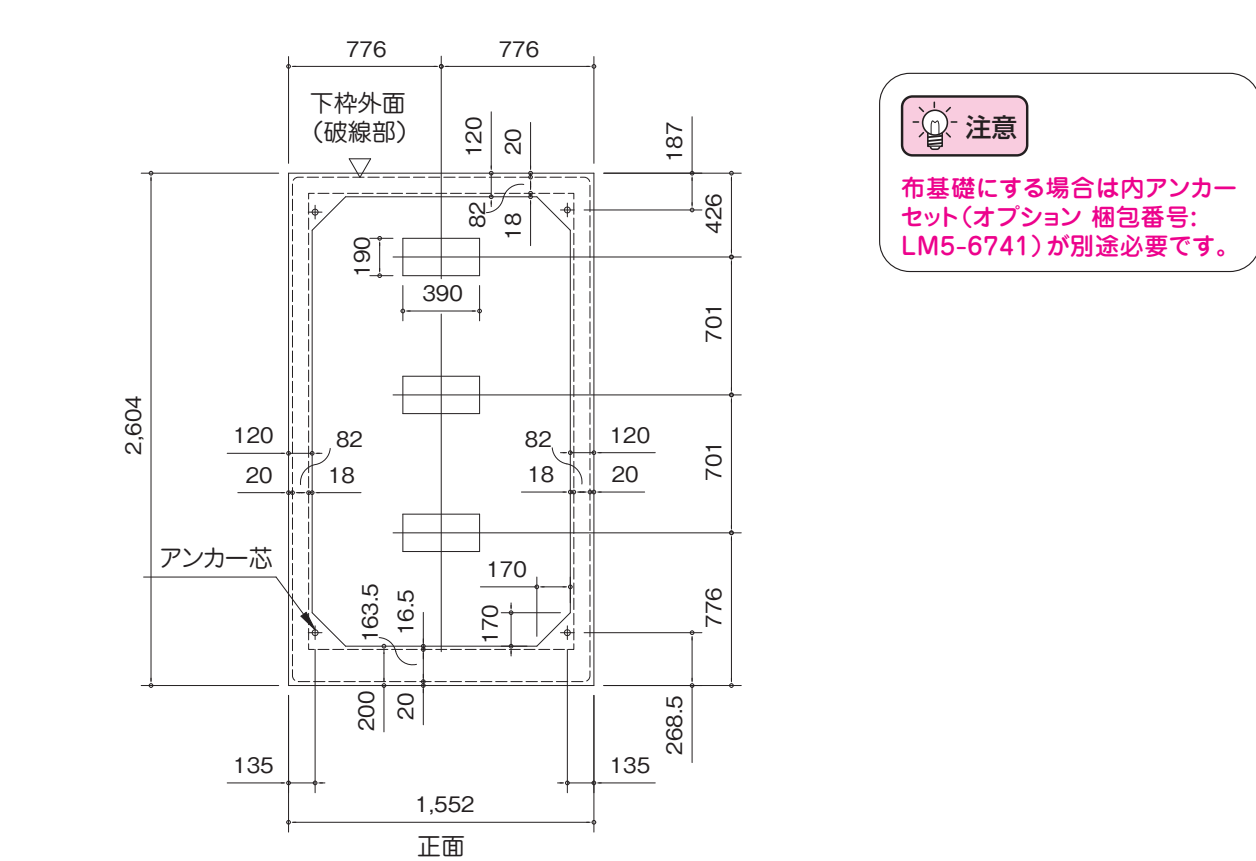


② 下枠側を 下枠前AS・下枠後 の上から設置して4隅をボルト止めします。

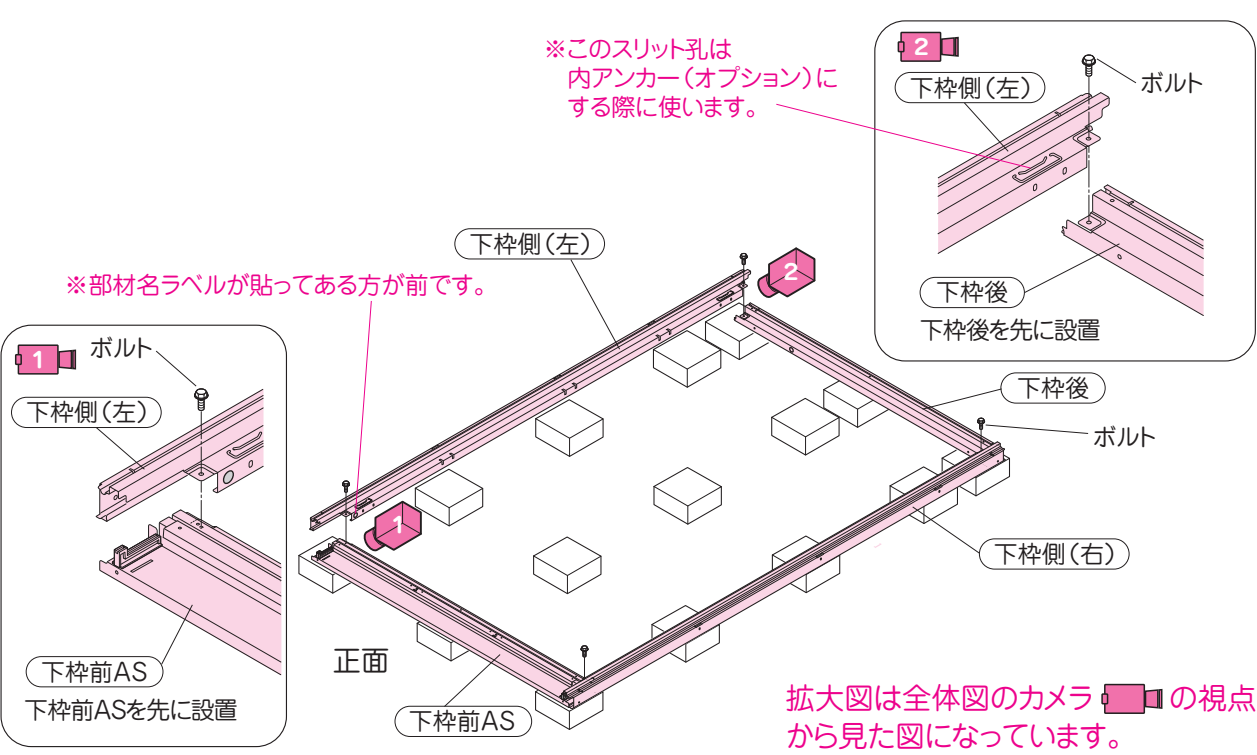


① **床補強** を下枠側の切欠きに差し込んで取付けます。

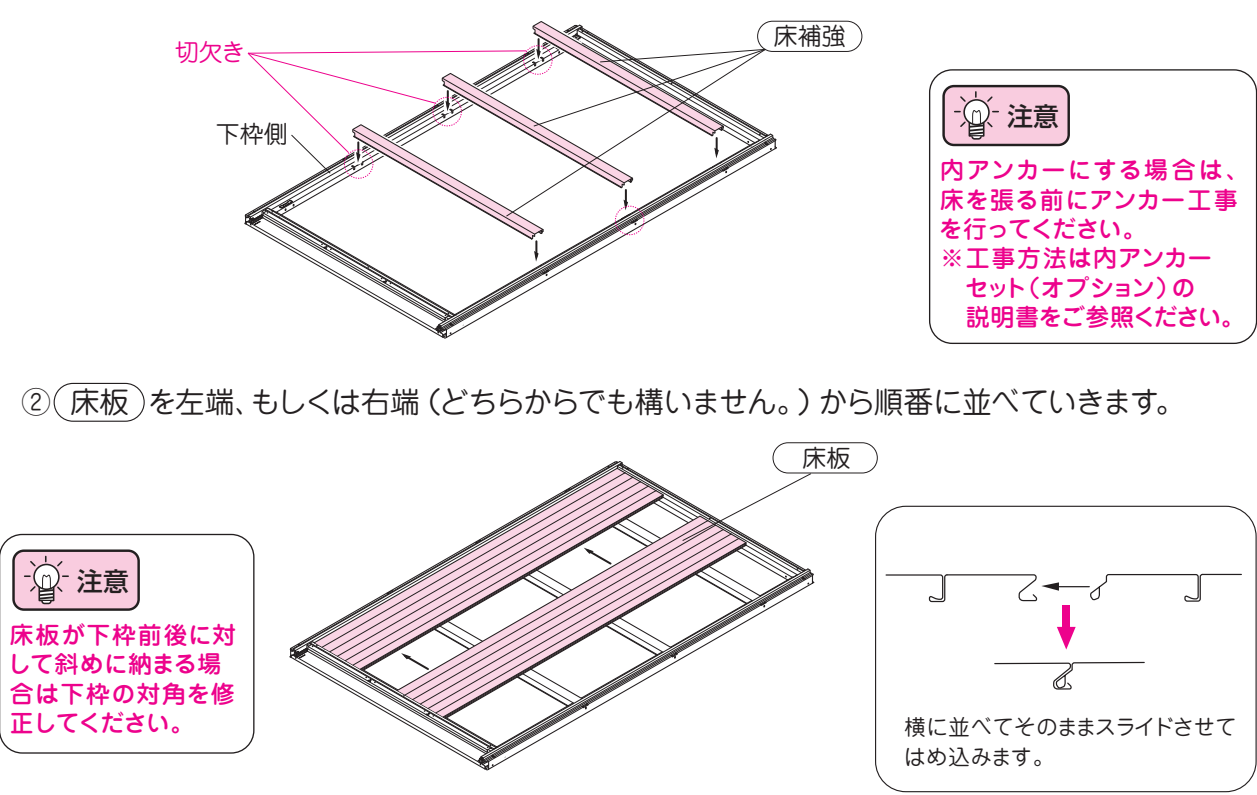


① (床押え) を下枠前AS・下枠後に取り付けます。

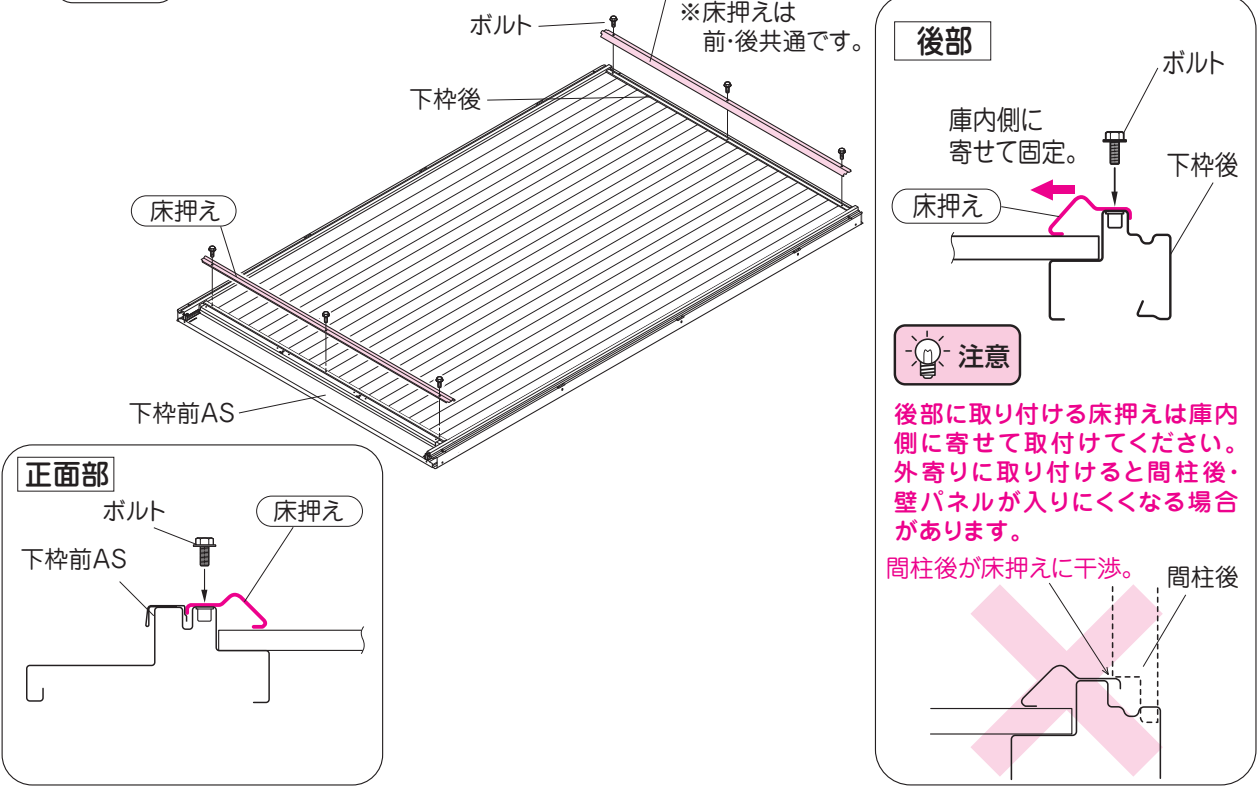


① (柱前AS)・(柱後)を下枠の4隅の切欠き孔に差し込んでボルト止めします。

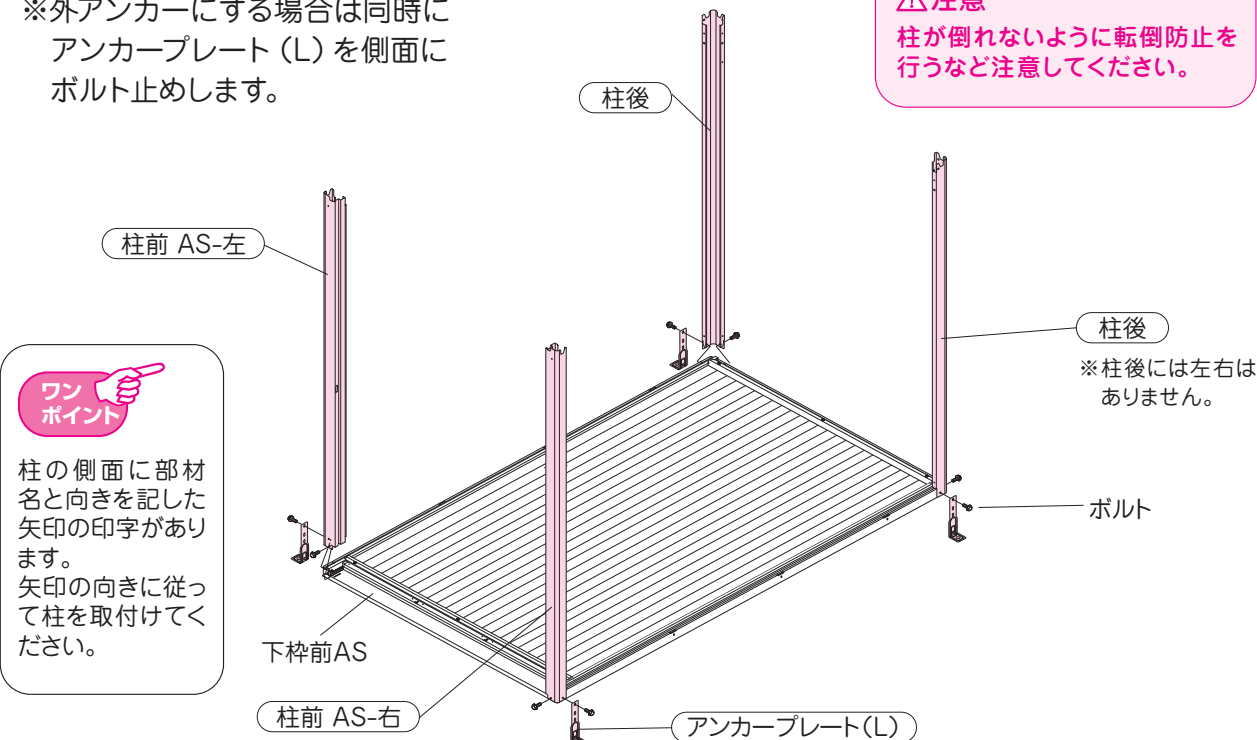

① 上枠前AS を柱前ASの突起に差し込んでボルト止めます

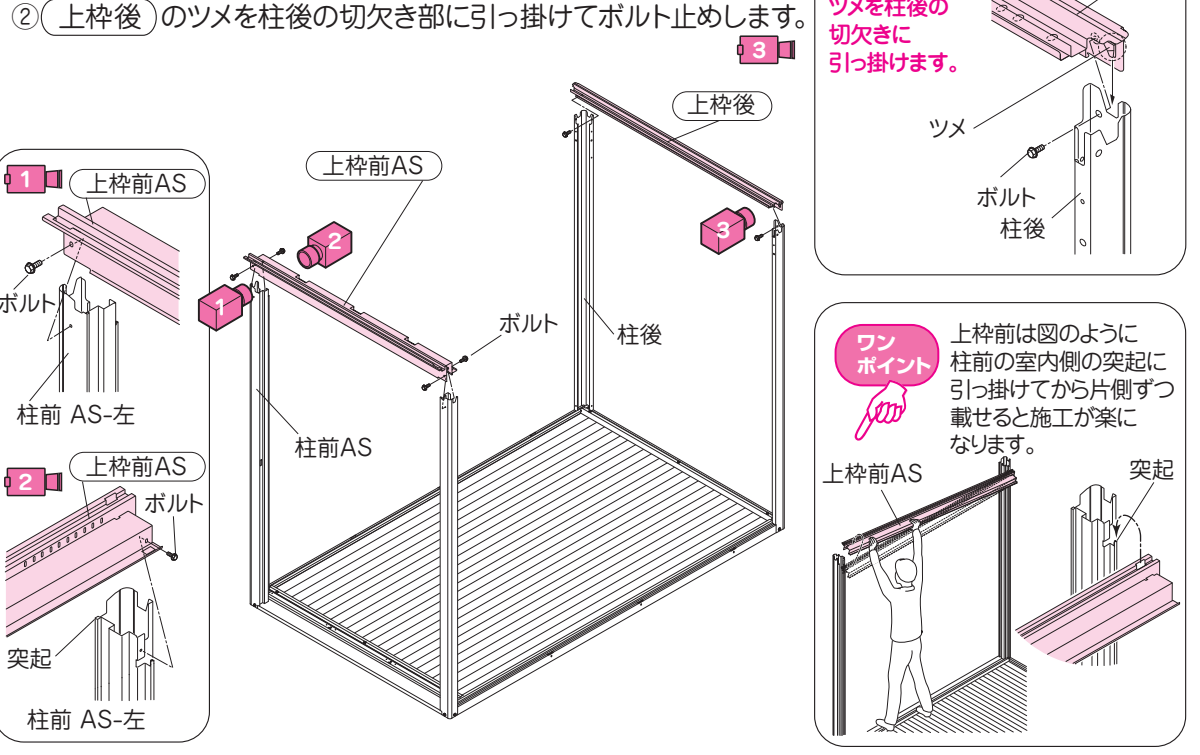


① 上桢左・上桢右を柱に取付けます。1 2

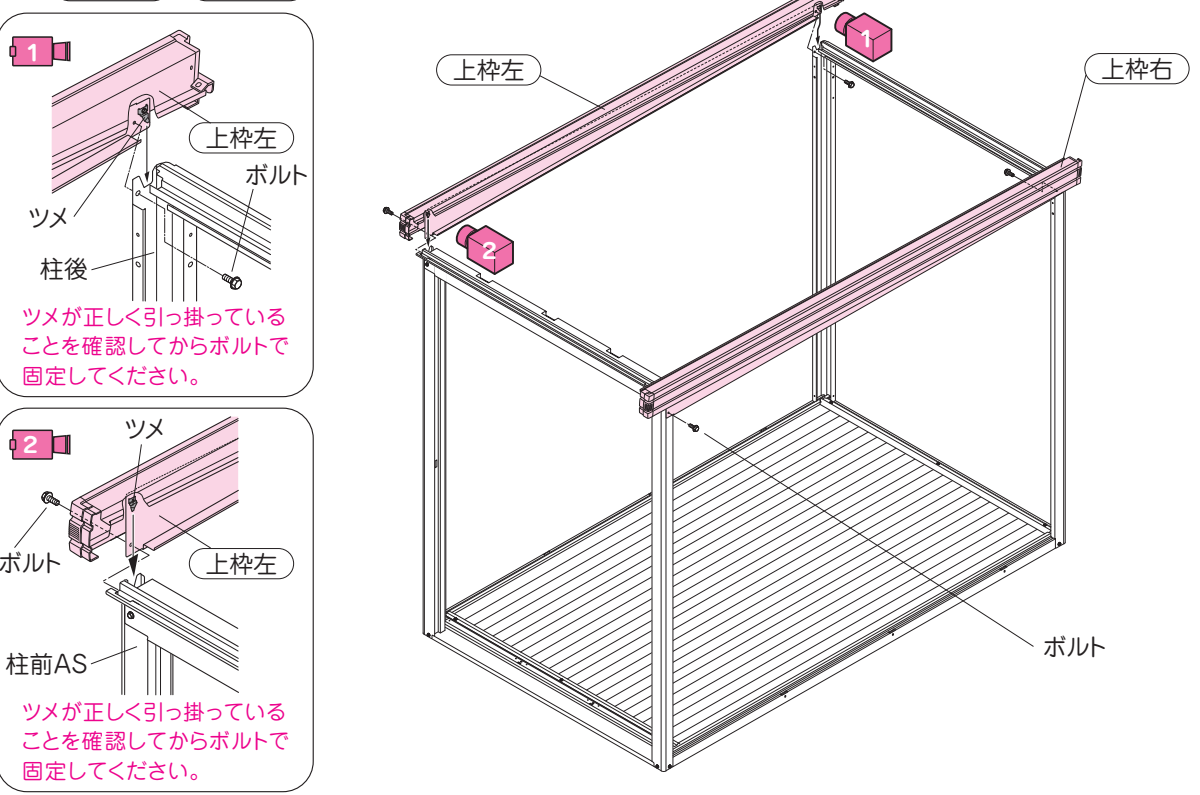


①(間柱後)の上端を上枠後に差し込み次に下端を下枠に差し込んでボルト止めします。

②(間柱側)も同様にして取付けます。

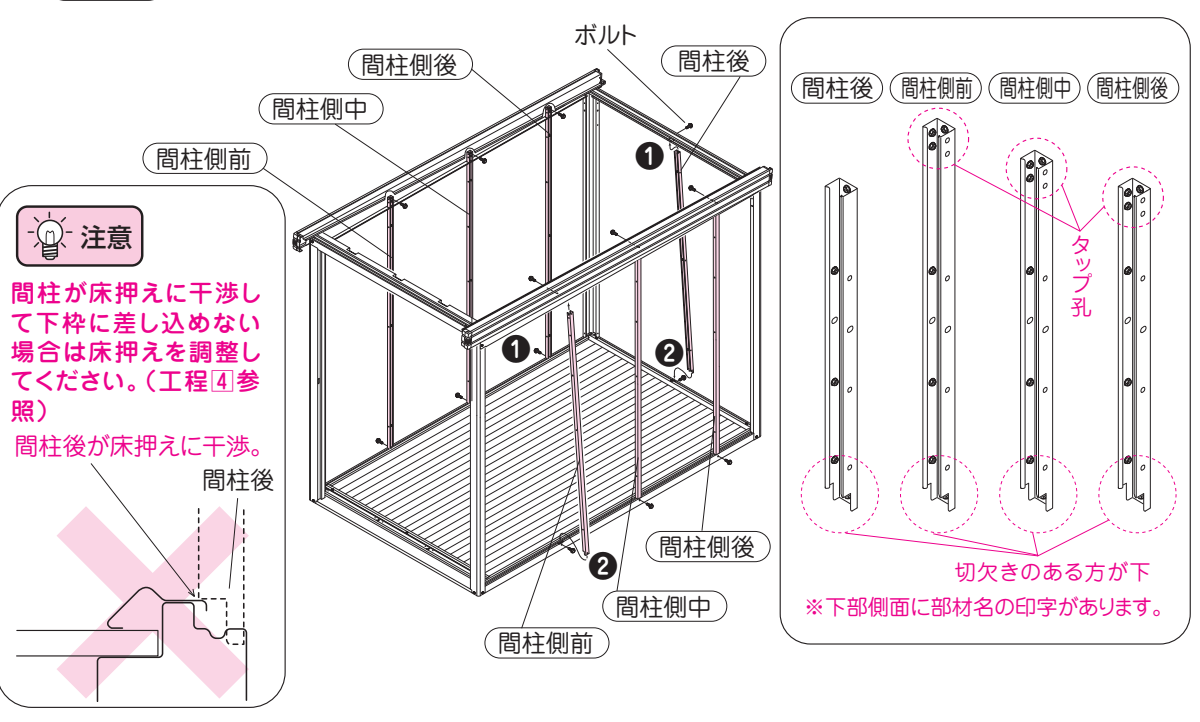


①(屋根)を右端から順番に載せて上枠前・上枠後とボルト止めます。

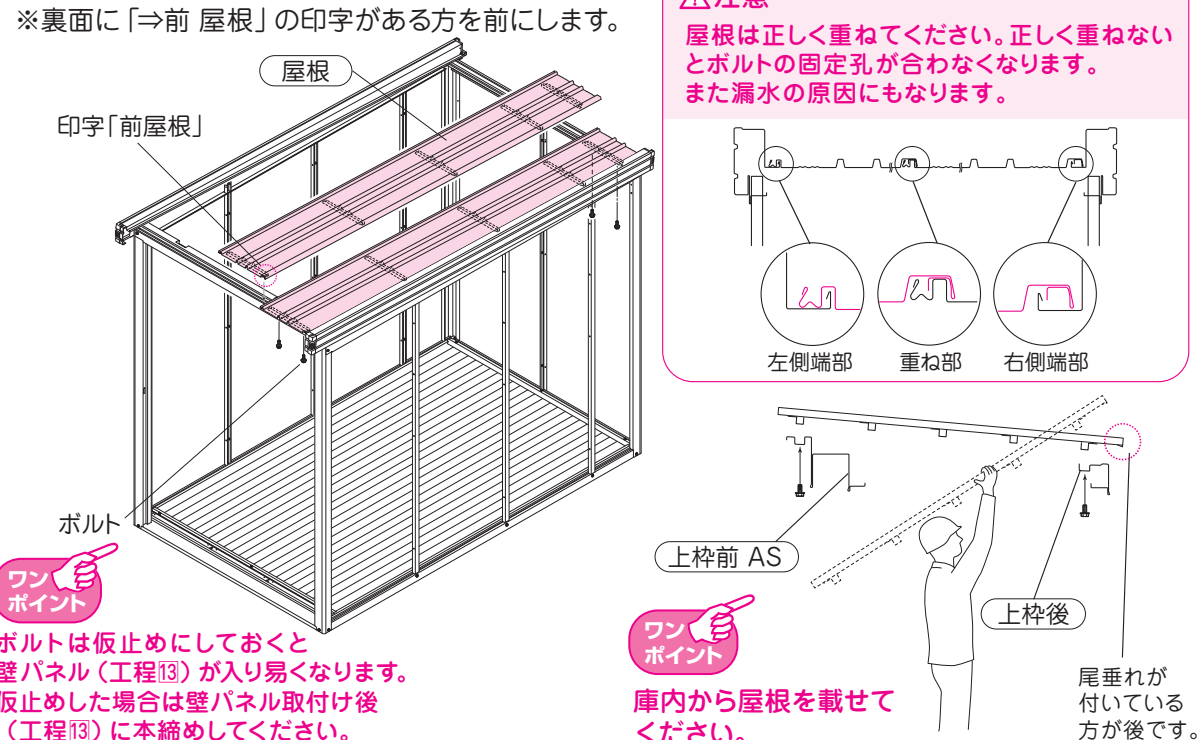


10 もやの取付け

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

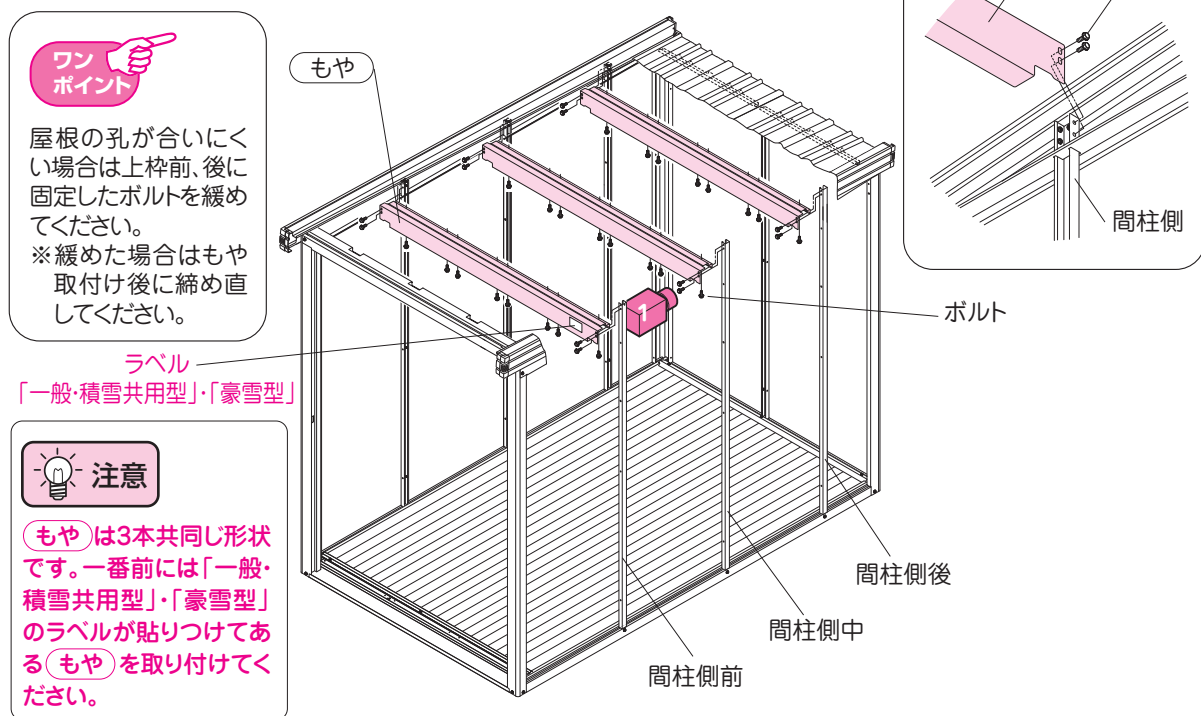


11 間柱前の取付け

- 注意** 工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて組立説明書11・12・14・16・17・19を読んでください。
- ① (間柱固定金具) を上枠前AS、下枠前ASそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
 - ② (間柱前) の上側を先に入れ次に下側を入れて両端をボルト止めします。

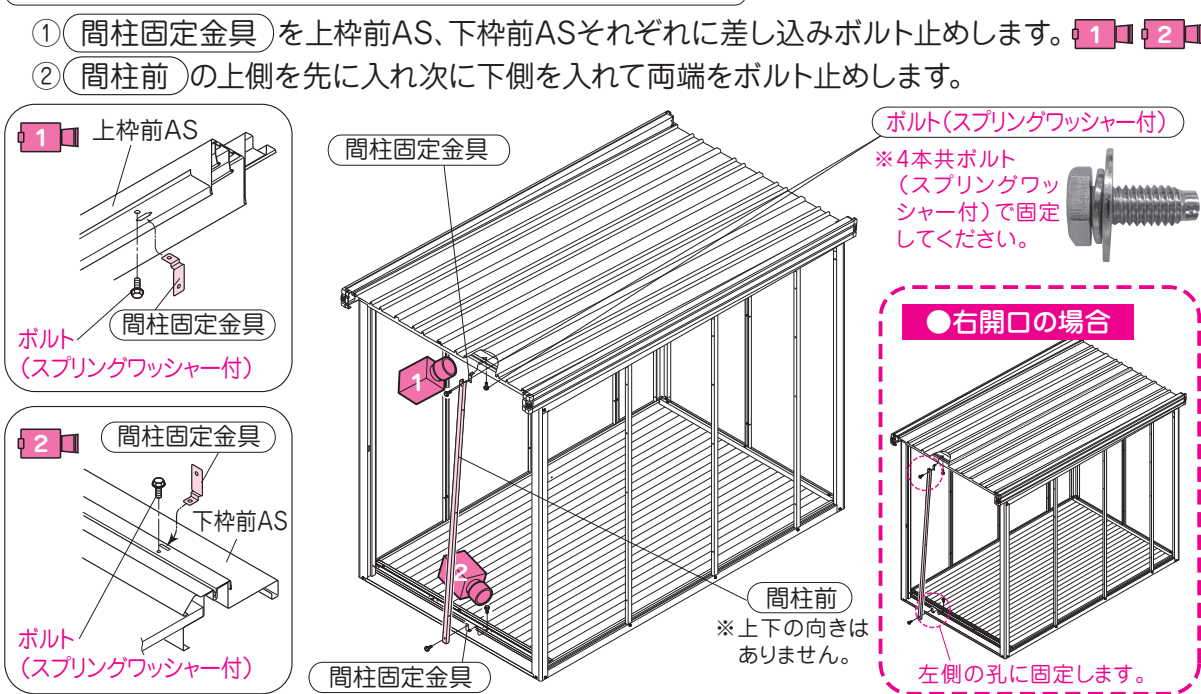


12 戸当たりの取付け

- ① (戸当たり(M)) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。- 工程17参照

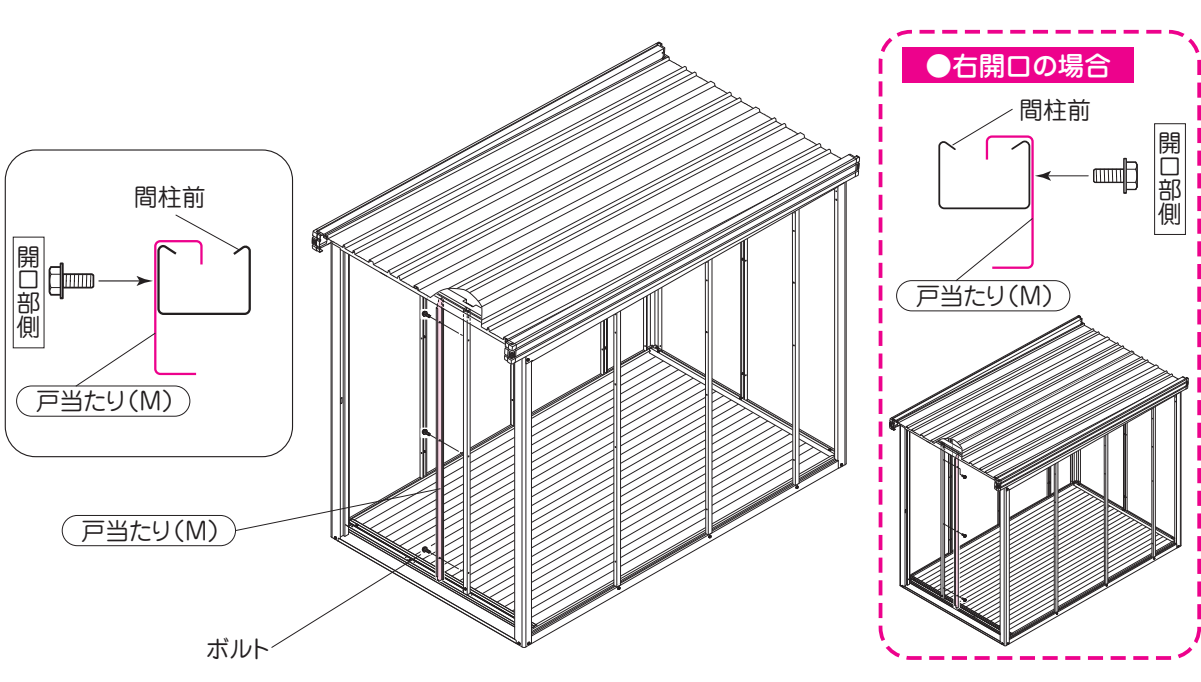


13 壁パネル・袖壁の取付け

- ① 室内から(壁パネル・袖壁パネル)をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1** **2** (開口部側面の壁は柱補強金具と一緒に固定します。- 工程14参照)

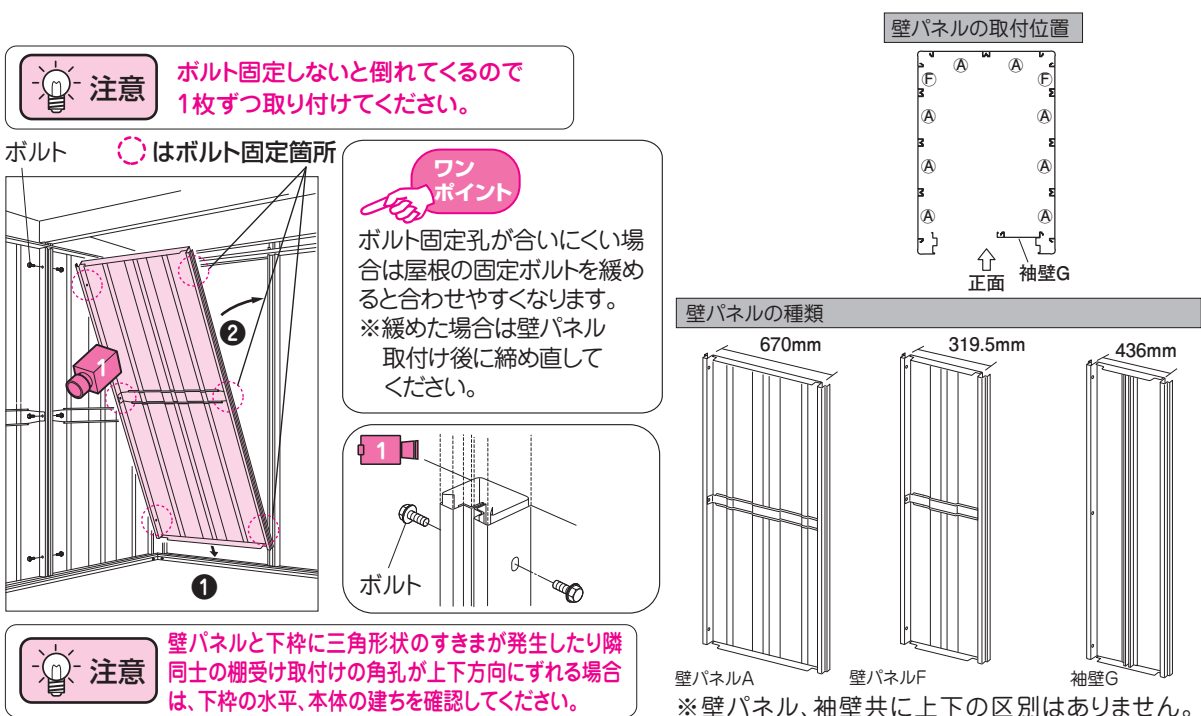


14 柱補強金具の取付け

- ① (柱補強金具AS) を柱前AS-左 (右側開口の場合は柱前AS-右) にボルト止めします。**1**
- ② 壁固定用ボルト孔はボルトで塞ぎます。

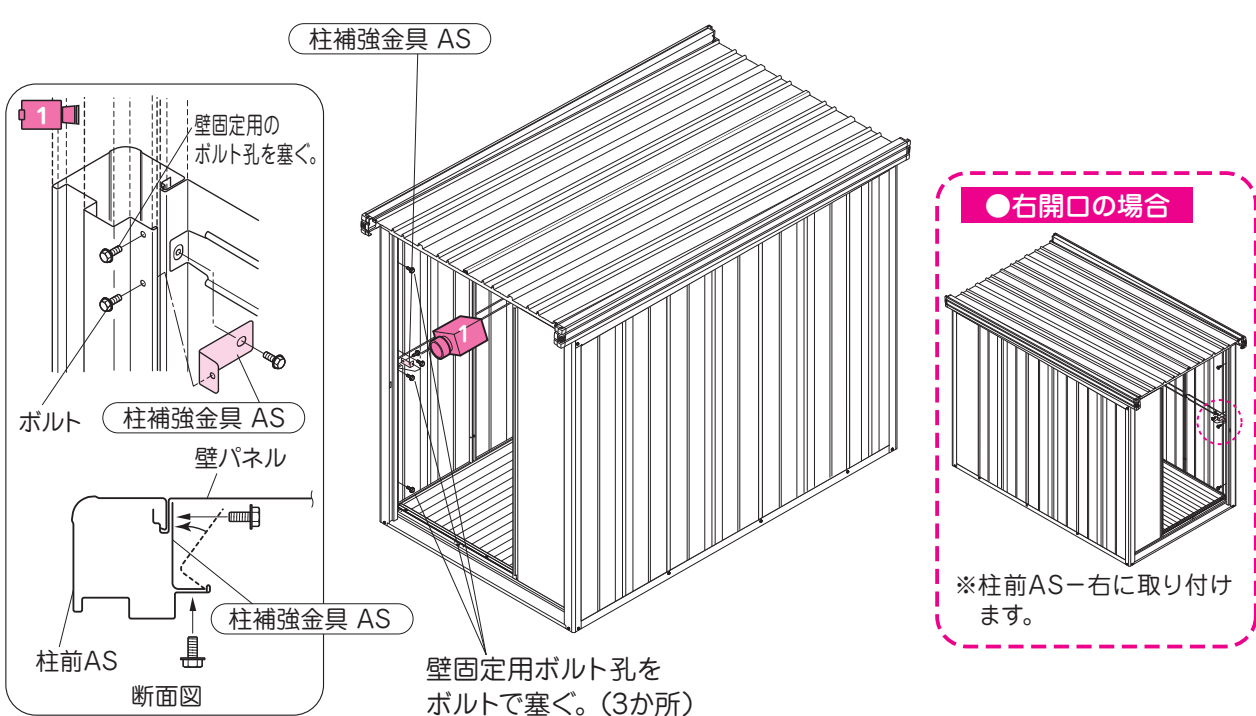

15 鼻隠しの取付け


- ① (鼻隠し前)・(鼻隠し後) を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② (鼻隠し後) と屋根をボルト止めします。**1**

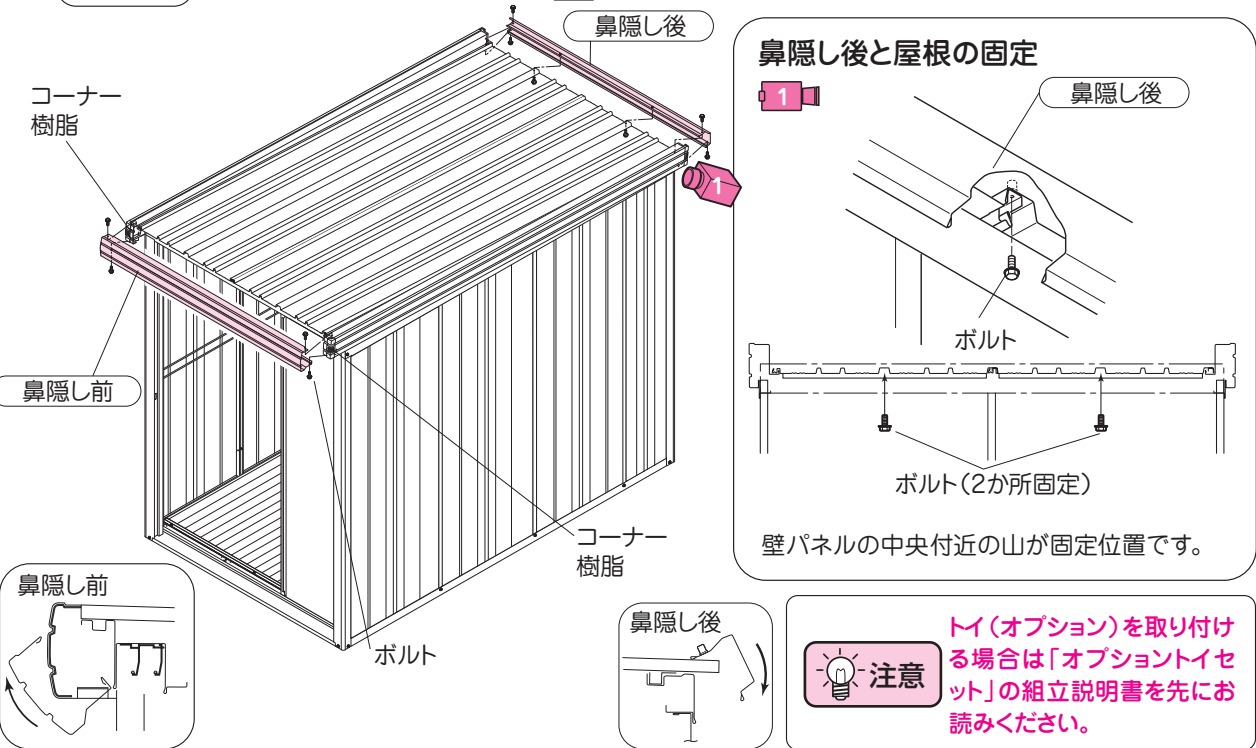

16 扉吊元変更 (右開口に変更する場合のみ)


- 注意** 右開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。左開口の場合はこの工程は必要ありません。

- ① 扉後から (戸車プレート(右)) を取り外し扉前の戸車プレートが付いていない方に取付けます。
- ② 扉後の (扉後隙間隠し) (扉支持金具) を取り外して扉後の反対側に取付けます。
- ③ 扉前の最初に付いていた (戸車プレート(左)) を取り外して扉後に取付けます。

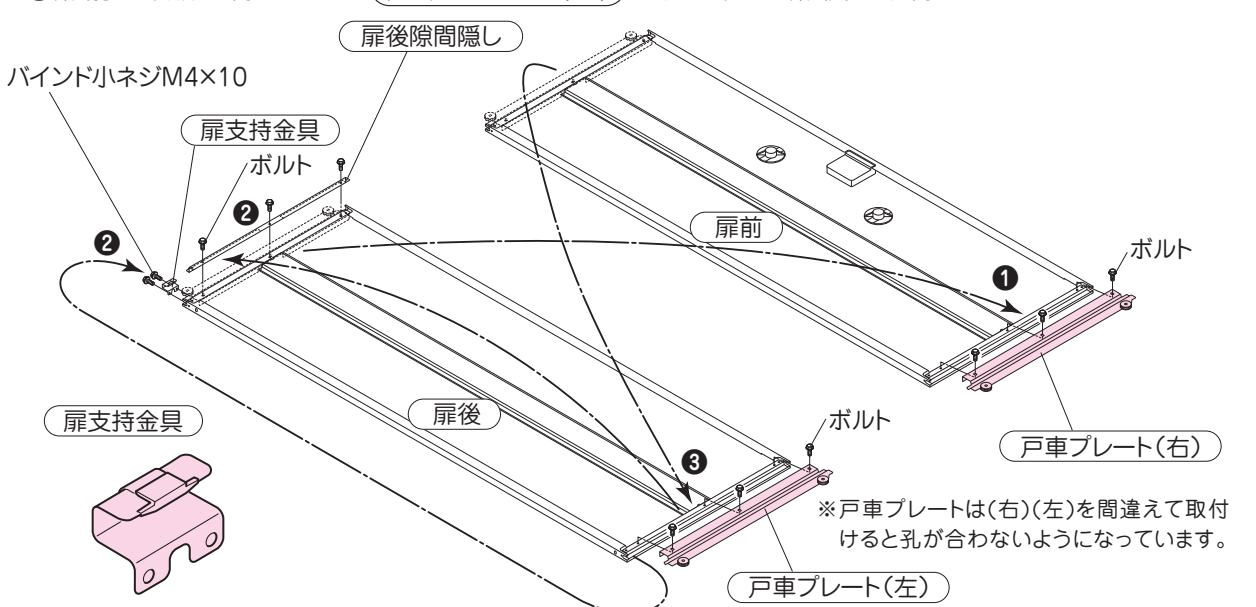



17 扉の吊り込み(1)

- ① (扉支持材AS) を (扉前) に取付けます。

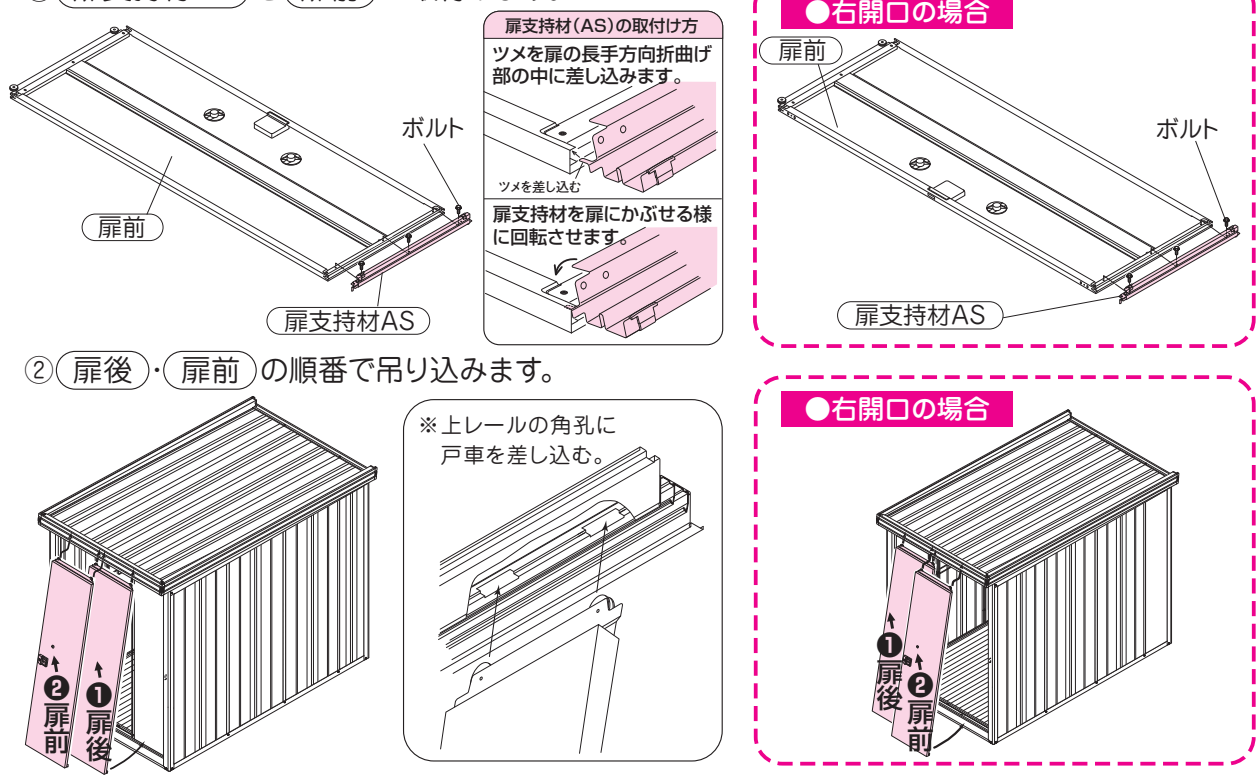


17 扉の吊り込み(2)

扉の吊り込み手順

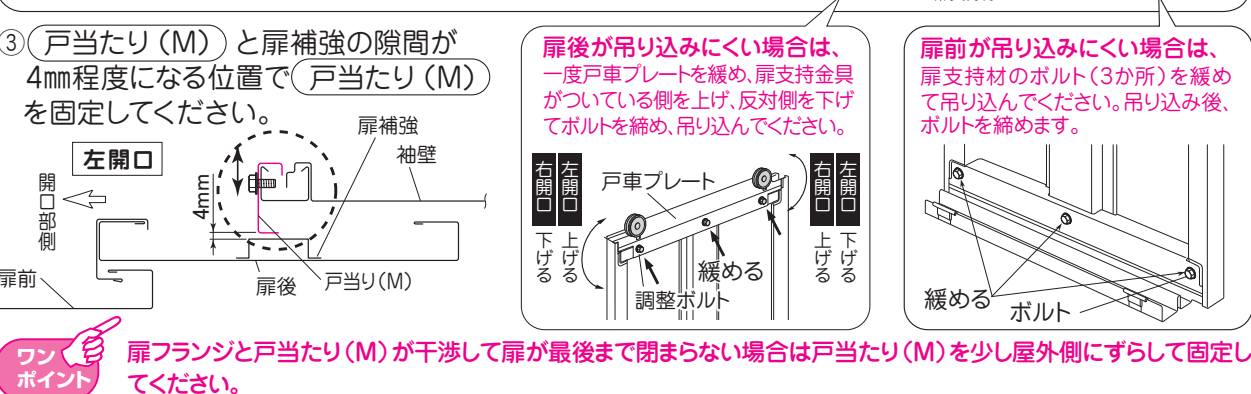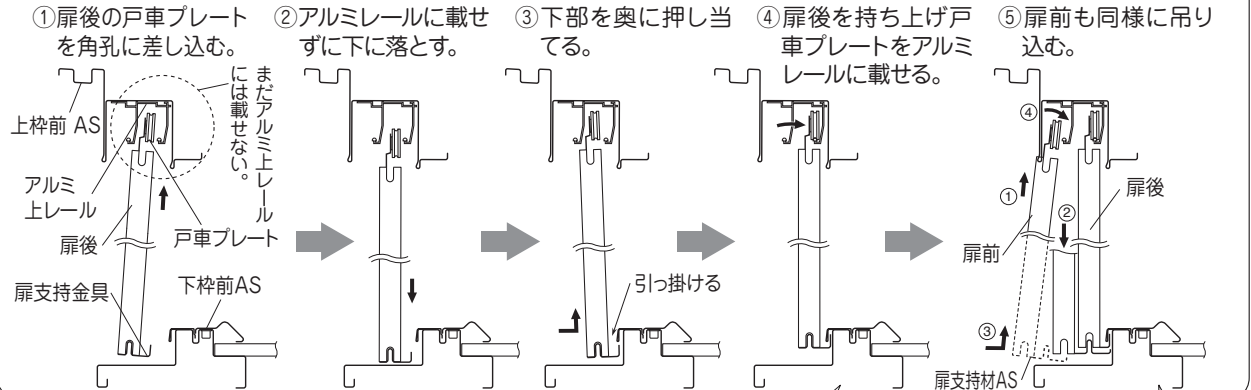


18 戸車上昇防止プレートの取付け

- ① (戸車上昇防止プレートAS) を上枠前ASに取付けます。(3か所) **1**

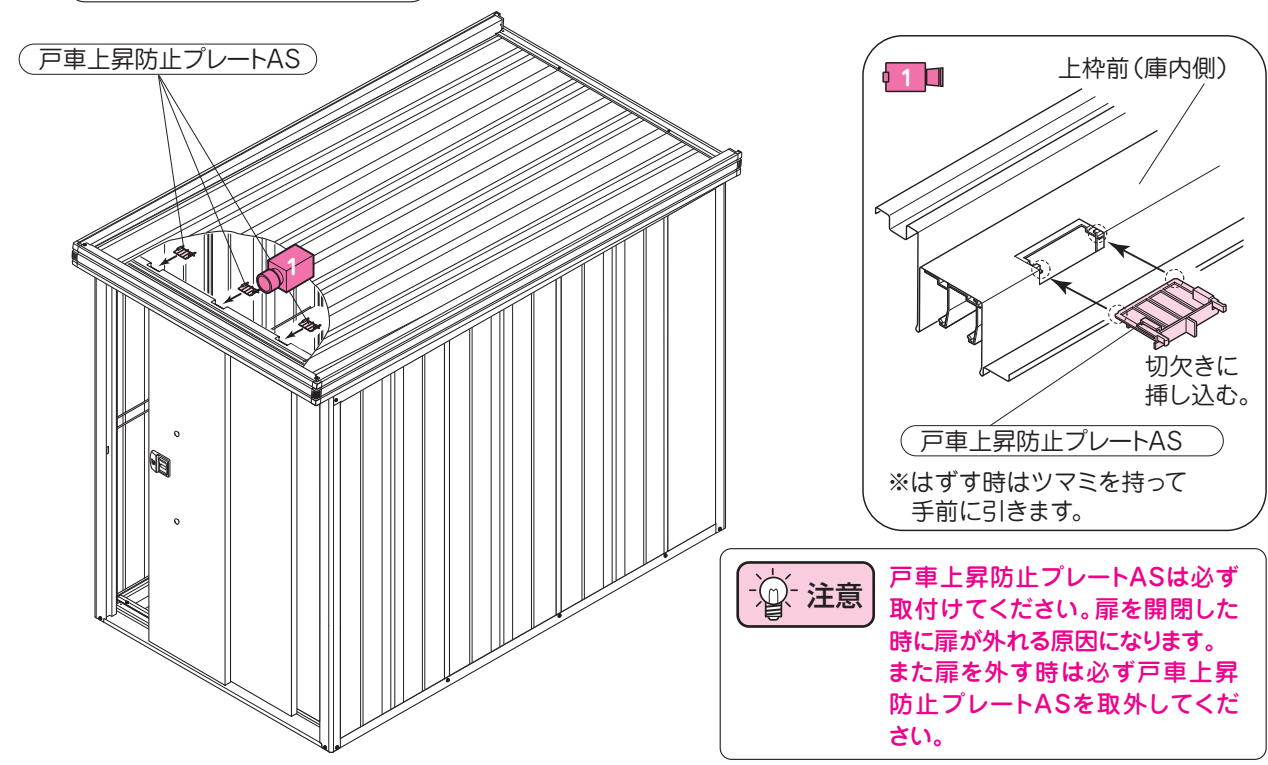


19 取手の取付け

- ① (取手) を扉前の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の (取手取付け材) を回して取手を固定します。

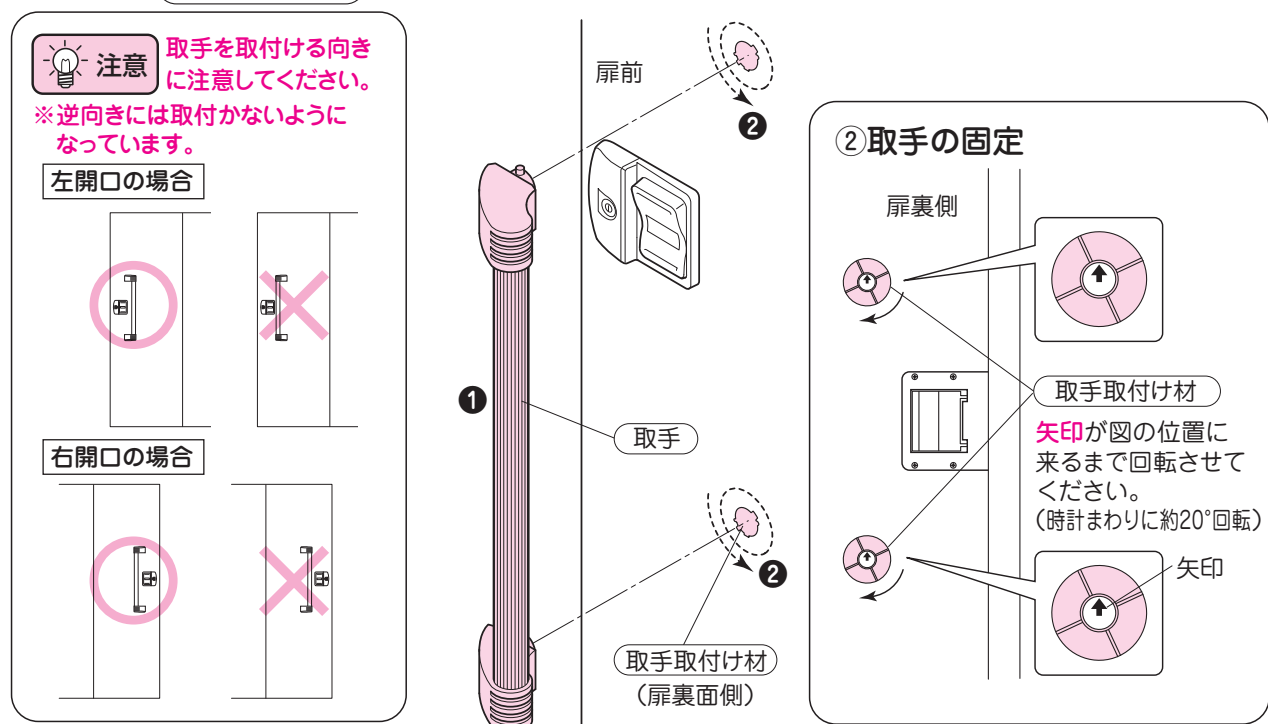


20 連動車の取付け

- ① 扉後の連動車取付け部下側の固定孔にボルトを仮止めします。(ネジ部を5mm程度残してください)
- ② (連動車) のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。**1**
- ③ (連動車) をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
- ④ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

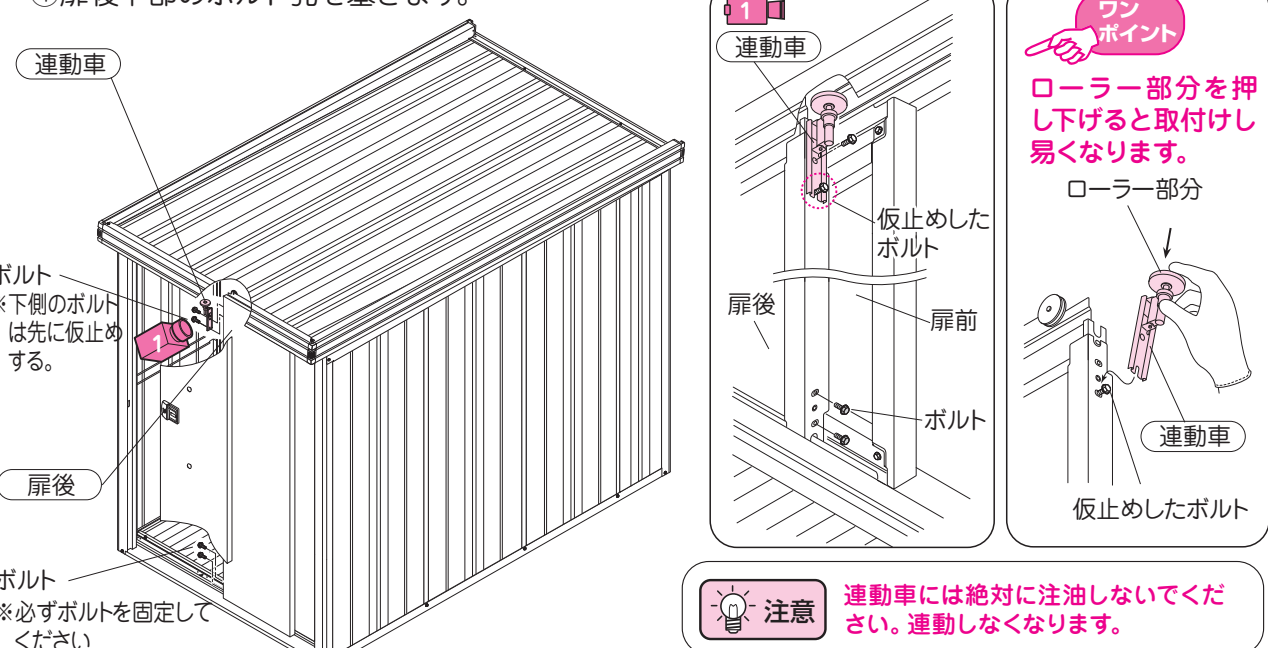


21 扉の建付け調整

- ① 扉を開けて柱と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。

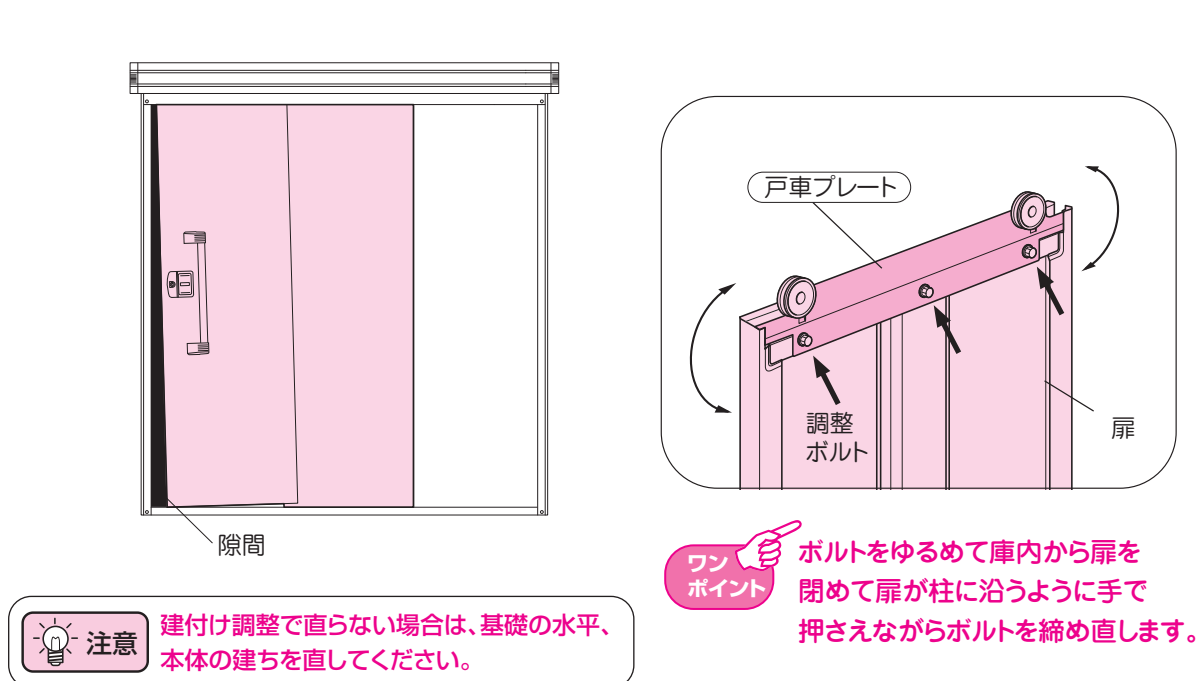


22 棚板の取付け

- ① (棚受) を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② (棚板) を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

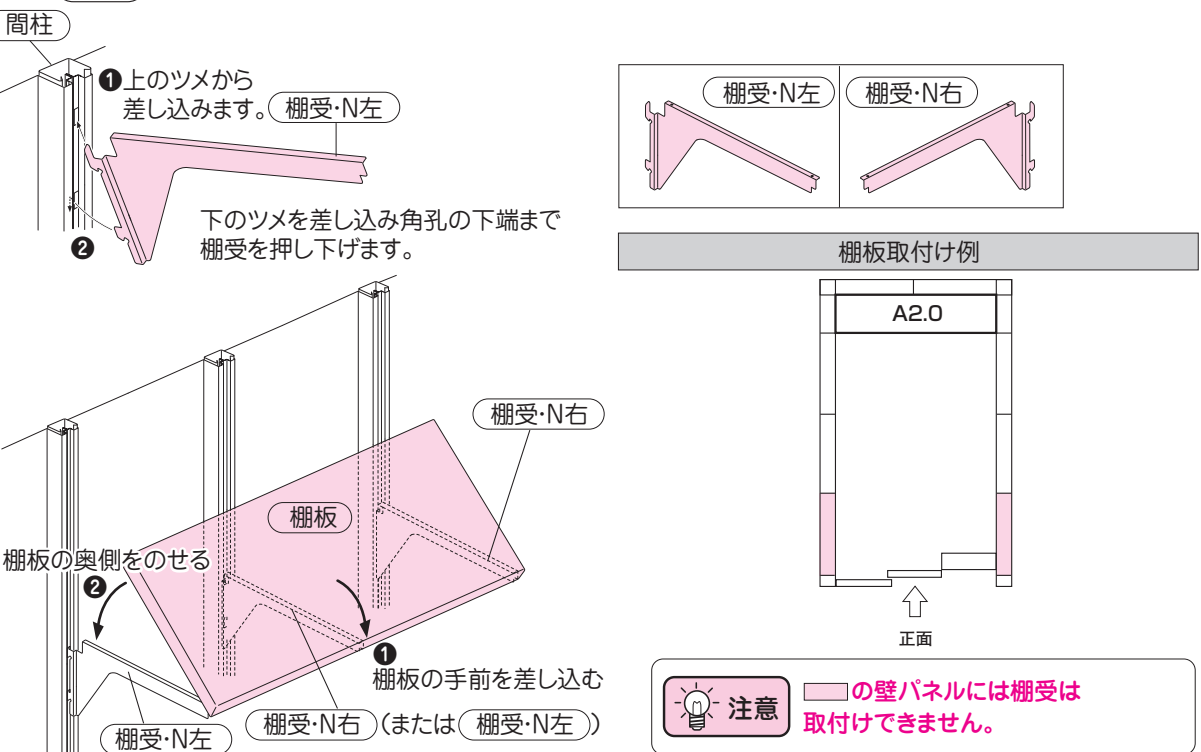

23 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに`機種名、を記入します。
- ② (屋根隙間隠しA) を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB) を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**
- ③ (下レールキャップ) を下枠前に取付けます。**2**
- ④ (鍵孔フサギ) を袖壁側の柱前に取付けます。**3**

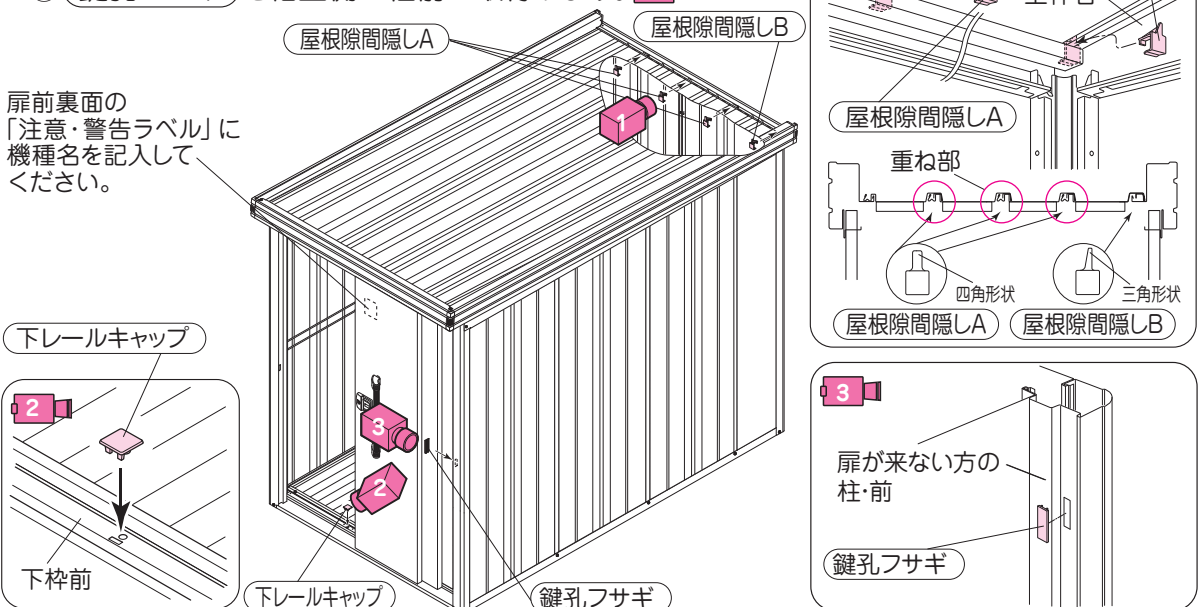

- 錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

